



LOTTO 4 - SITO PONTE RICCIO

—◆—
AFFIDAMENTO SERVIZIO RIMOZIONE, TRASPORTO, RECUPERO
ENERGETICO E/O MATERIA RIFIUTI STOCCATI IN BALLE

Napoli, 28/02/2018

LOTTO 4 - PONTE RICCIO

PIANIFICAZIONE ATTIVITÀ


MILESTONE ATTIVITÀ

"affidamento del servizio di rimozione, trasporto, recupero energetico e/o di materia in ambito nazionale e Comunitario e/o smaltimento in ambito Comunitario, di rifiuti stoccati in balle presso siti dedicati nel territorio della Regione Campania"

Bando di gara Proc. n. 2342/A/17	D.D. n. 63 del 23 Marzo 2017
Presentazione offerta A2A	02 Maggio 2017
Aggiudicazione bando di gara	D.D. n. 164 del 07 Settembre 2017
Stipula contratto relativo Lotto 4	30 Novembre 2017
Consegna Lotto 4 - Ponte Riccio	05 Dicembre 2017
Inizio attività A2A	11 Dicembre 2017

PROGRAMMA SVUOTAMENTO RSB LOTTO 4

PIANIFICAZIONE ATTIVITÀ

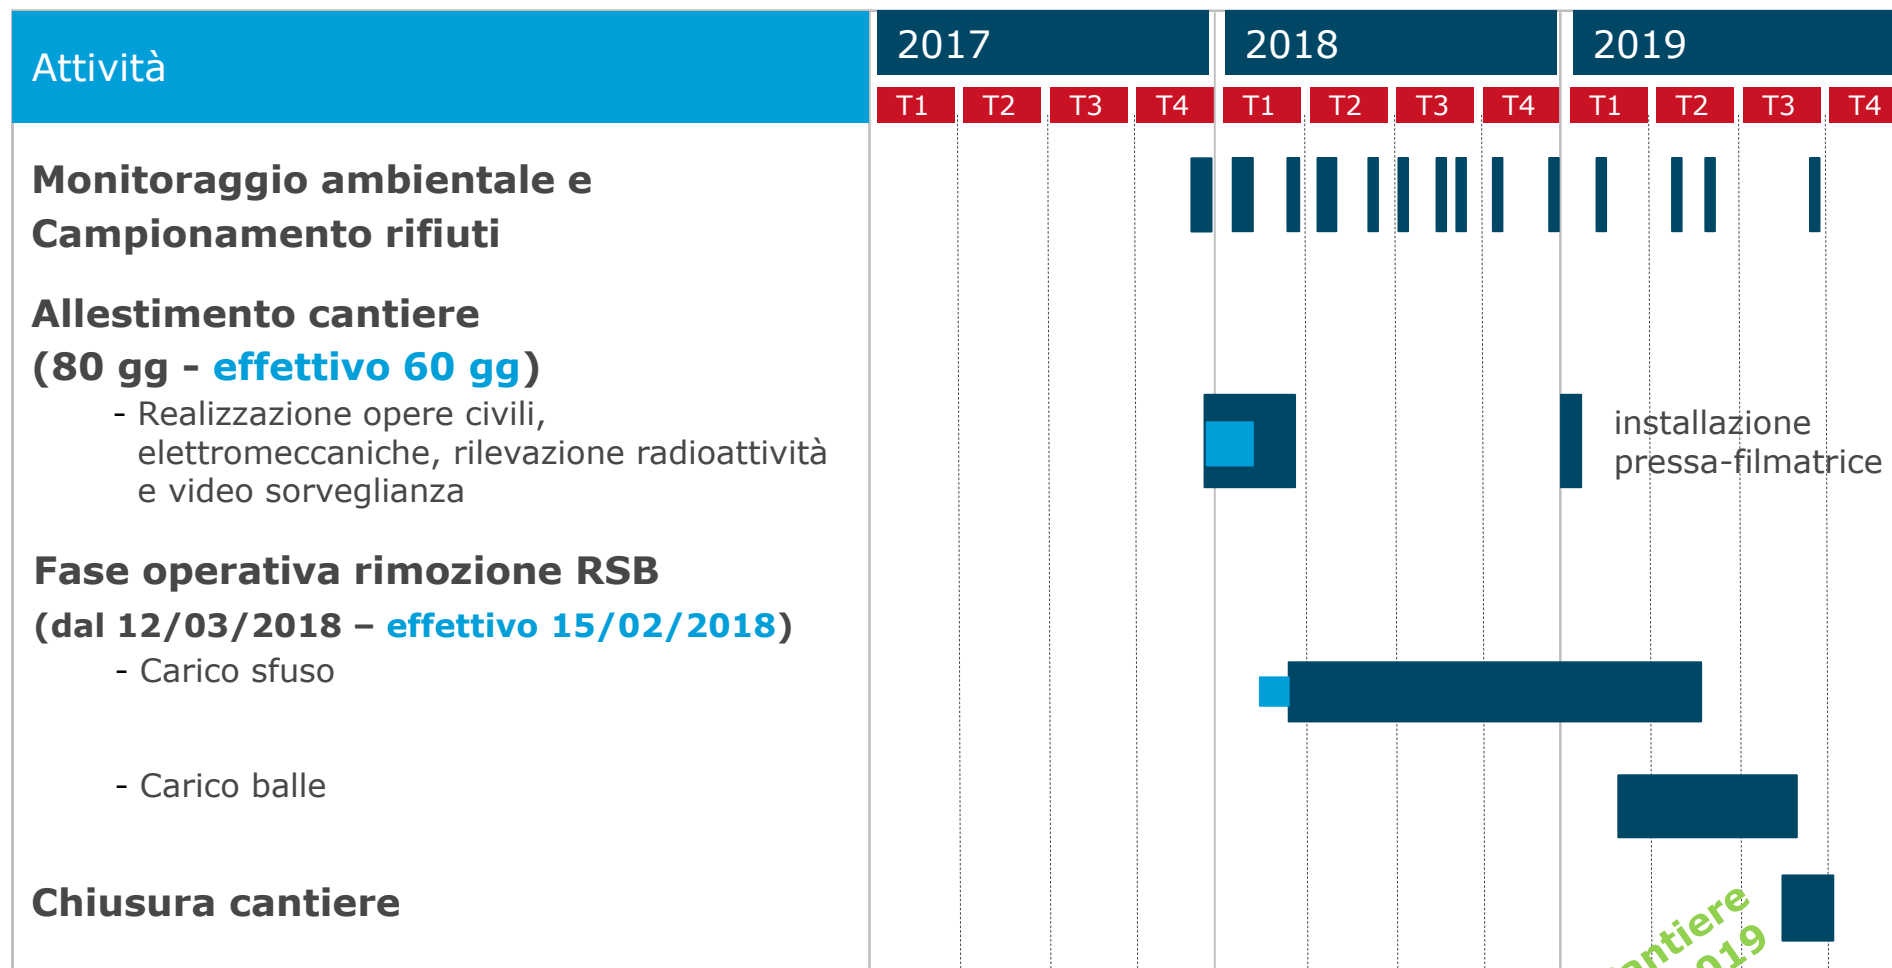

**Fine Cantiere
30/09/2019**

Elenco matrici monitorate per un numero totale di analisi eseguite pari a 56:

1	MATRICE ARIA	32 campioni	★
2	SOSTANZE ODORIGENE	02 campioni	★
3	MATRICE SUOLO (TOP SOIL)	05 campioni	●
4	MATRICE SOTTOSUOLO (ACQUE SOTTERRANEE)	03 campioni	●
5	RUMORE	08 punti	●
6	INDAGINE MICROBIOLOGICA	04 campioni	●
7	RIFIUTO PRODOTTO	01 campione (acque spurgo piezometri)	
8	INDAGINE ELETROMAGNETICA	01 campione	



CAMPIONAMENTO E CARATTERIZZAZIONE

Effettuato 1 campione ogni 1.000 tonnellate	44.000 tonnellate analizzate
Validati da ARPAC	20% campioni
ARPAC ha confermato la non pericolosità del rifiuto come RIFIUTO SPECIALE NON PERICOLOSO	
Prelievo totale rifiuti per analisi	8.000 kg
Analisi eseguite in campo	44 analisi merceologiche manuali
Analisi eseguite in laboratorio certificato e ARPAC	54 analisi chimiche



Allestimento cantiere

Presentazione SCIA per realizzazione cantiere temporaneo

29 Dicembre 2017

Posizionamenti container da lavoro: uso spogliatoio, mensa, guardiana

Installazione pesa con telecamere per lettura targhe e controllo carico

Installazione portale per il controllo radioattività

Video sorveglianza wireless con connettività web

22 telecamere di controllo



Alimentazione elettrica con energia solare per videosorveglianza e illuminazione



Fase operativa rimozione RSB

Avvio cantiere: 15/02/2018



Tonnellate rimosse

500
